



inovaya

Let's reinvent the world of water

Avril 2026

CAHIER DES CHARGES

ERP Gestion de projet



INOVAYA SAS

Dont le siège social est situé 254 rue Vendôme 69003 Lyon
Immatriculée au RCS de Lyon B 837 594 027
Capital Social 75 841,00 euros
665 rue Pasteur - 38760 Chasse-sur-Rhône
info@inovaya.com | www.inovaya.com | +33 4 28 29 42 31



SOMMAIRE

I. PRESENTATION GENERALE	3
1. Contexte de l'entreprise.....	3
2. Contexte du projet et objectif de l'ERP	3
II. PERIMETRE FONCTIONNEL ATTENDU.....	4
1. Exigences fonctionnelles globales.....	4
2. Exigences fonctionnelles détaillées	4
a. Coordination générale et planification.....	4
b. Coordination projet	6
c. Composante logistique / achats.....	7
d. Composante finance.....	7
e. Composante RH.....	8
3. Interconnexions	8
III. ETUDE DE MARCHE	11
DÉTAILS DU DOCUMENT	12

I. PRESENTATION GENERALE

1. Contexte de l'entreprise

InovaYa est spécialisée dans le traitement des eaux et effluents. Notre mission est de préserver la ressource en eau afin de la rendre accessibles à toutes et tous. Pour y parvenir nous agissons d'abord sur la réduction de l'empreinte eau des activités humaines. Nous accompagnons ainsi une large diversité d'acteurs issus du secteur industriel mais également des collectivités locales à repenser leur rapport à l'eau et leurs usages. Notre accompagnement couvre l'ensemble du cycle de projet du diagnostic jusqu'à la conception et la mise en service d'unités de traitement.

Jeune entreprise innovante, notre activité tourne également autour de notre pôle R&D avec des projets de développement de nouvelles technologies mais également des projets digitaux.

Les projets menés chez InovaYa sont divers mais nous tendons à nous standardiser, nous orientant un maximum vers la répliquabilité de notre activité.

2. Contexte du projet et objectif de l'ERP

Dans le cadre de l'évolution de nos pratiques de pilotage de projets et à la suite des retours formulés par les équipes opérationnelles, nous souhaitons procéder à la réévaluation de notre outil actuel de gestion de projet (Monday) voire à son remplacement.

Globalement l'ERP GdP doit répondre aux besoins suivants :

- Centraliser l'ensemble des données projets ;
- Améliorer la planification et l'anticipation des charges ;
- Sécuriser les délais et les budgets ;
- Faciliter la coordination entre équipes opérationnelles, managers et fonctions support ;
- Disposer d'un outil fiable pour le pilotage opérationnel et décisionnel ;
- Répondre au besoin de souveraineté.

Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'améliorer significativement la coordination entre les différents pôles, le management des équipes opérationnelles (via l'optimisation de la gestion des plans de charge des équipes) et de renforcer la visibilité globale sur les ressources, les budgets et les délais des projets.

Le futur outil devra ainsi permettre un pilotage plus fiable, plus transversal et plus anticipatif de l'ensemble de nos projets qu'ils soient IND, CLIENT (TEE), R&D ou DIGITAUX mais également de projets qui s'inscrivent dans une dynamique interne telle que les groupes de travail issus des journées assainissement.

II. PERIMETRE FONCTIONNEL ATTENDU

1. Exigences fonctionnelles globales

L'ERP devra couvrir les composantes suivantes :

- Coordination générale et planification ;
- Coordination de projet ;
- Suivi des temps ;
- Logistique / achats ;
- Finance / suivi budgétaire ;
- RH (absences, déplacements).

2. Exigences fonctionnelles détaillées

a. Coordination générale et planification

L'ERP GdP devra proposer trois niveaux de coordination et de planification interconnectés :

- Niveau Manager :
 - o Plan de charge global de son équipe avec visualisation hebdomadaire et mensuelle ;
 - o Espace « Pôle » dédié pour ajouter des tâche annexes hors projet à ses équipes. Cet espace alimentera le tableau de bord collaborateur ;
 - o Plan de charge automatiquement alimenté par les plannings projets ;
 - o Mise à jour dynamique en fonction des modifications projets.
- Niveau Projet : Planning projet détaillé avec : Tâches, Temps alloué, Ressources affectées, échéances
- Niveau Collaborateur¹ : Tableau de bord et Planning individuel de type « planification personnelle », pour chaque tâche : Projet associé, Temps alloué, Échéance, Priorité, Statut, Temps réalisé

Le collaborateur devra pouvoir manuellement :

- o Mettre à jour le statut des tâches ;
- o Saisir le temps réellement passé à leur réalisation ;
- o Ajouter des tâches qui ne sont pas liées à un projet via un espace du type « Mon travail ».

Exemple de « tableau de bord collaborateur » :

¹ Pour les équipes opérationnelles la majorité de leur plan de charge est liée aux projets sur lesquels elles sont affectées, pour cette raison il nous semble pertinent d'inclure dans l'ERP GdP cette fonctionnalité/vue « échelle collaborateur » regroupant ses tâches liées à un projet et ses tâches annexes.

Figure 1 : Exemple d'outil de planification collaborateur

Le diagramme illustre la matrice d'Eisenhower, une méthode de gestion du temps basée sur deux axes : l'importance (axe vertical) et l'urgence (axe horizontal). La matrice est divisée en quatre quadrants, chacun avec une couleur distincte et une action recommandée :

- Quadrant supérieur gauche (Violet) :** Important mais non-urgent. Action recommandée : **PLANIFIER**.
- Quadrant supérieur droit (Orange) :** Important et urgent. Action recommandée : **FAIRE**.
- Quadrant inférieur gauche (Vert) :** Non-urgent et non-important. Action recommandée : **ÉLIMINER**.
- Quadrant inférieur droit (Jaune) :** Urgent mais non-important. Action recommandée : **DÉLÉGUER**.



L'ERP devra intégrer un **outil de suivi des heures** à la demi-heure avec une alimentation automatique depuis les plannings collaborateurs et offrir une vision consolidée :

- Pour le.a chargé.e de projet : des heures dépensées par son équipe projet sur une période données ;
- Pour les managers :
 - o Des heures par personne pour un suivi hebdo du temps de travail avec une alerte au manager et service RH en cas de dépassement du nombre d'heures hebdo ;
 - o Des heures par typologie de tâche et de verticale (exemple : P&ID ou textile) afin d'en extraire des données de pilotage.

L'outil devra permettre à la responsable de pôle et plus largement à la Direction un pilotage de la feuille de route du Pôle GdP donc une intégration de cette dernière ainsi que de ses indicateurs de suivi. Enfin, l'outil devra permettre également le suivi d'impact de nos projets en intégrant une page dédiée.

b. Coordination projet

L'ERP devra intégrer des modèles de projet automatiquement générés en fonction de la typologie de projet sélectionnée. Les modèles intégreront les grandes phases et tâches standard du projet ainsi que des enveloppes ETPs de référence. Ces modèles de projet devront pouvoir être modifiés de manière autonome par InovaYa.

Une fois édités, ces modèles devront pouvoir être paramétrés manuellement par le.a Ch. de projet notamment pour les éléments suivants :

- Page « information projet » comprenant :
 - o Information sur le client ;
 - o Contacts clés ;
 - o Equipe projet ;
 - o Budget (information issue du chiffrage cial) ;
 - o Échéance de facturation.
- Ajout des ressources humaines ;
- Paramétrage des échéances (date de début et date de fin) ;
- Niveau d'importance de la tâche.

Une personnalisation de ces modèles par le.a ch. de projet au cas par cas doit rester possible.

Une fois les modèles remplis à savoir le projet créé, l'outil doit pouvoir générer automatiquement un planning avec plusieurs visualisations possibles, par exemple : global (planning du projet), par période, par personne, etc.

L'outil doit proposer une détection automatique des conflits de planning/de charge en considérant les tâches d'un collaborateur :

- Au sein du même projet ;
- Entre ses différents projets ;
- Annexes.

Une alerte doit ainsi être automatiquement générée (précision de la raison du blocage) et la planification de la tâche suspendue jusqu'à résolution du conflit.

Une vue type Kanban est également nécessaire notamment pour le pilotage de nos projets digitaux mais également afin de permettre une agilité dans le pilotage des projets par les gestionnaires projet.

c. Composante logistique / achats

La gestion logistique est une composante majeure de la gestion de projet. L'ERP GdP doit donc pouvoir communiquer avec l'ERP Log/achat afin de :

- Pouvoir créer un lien entre une demande d'achat et une tâche projet et son échéance. Un décalage dans la réception d'une commande peut affecter le planning d'un projet ;
- Recevoir des alertes en cas de mise à jour de la demande d'achat (retard de livraison, changement de statut de cette commande, etc.) ;
- Suivre les dépenses réalisées (cf. §d.composante finance).

Le même raisonnement s'applique pour les demandes de transport (matériel).

d. Composante finance

La gestion du budget est une autre composante majeure de la gestion de projet. L'ERP GdP doit donc pouvoir intégrer un suivi budgétaire du projet et permettre un pilotage financier macro du projet.

Suivi budgétaire :

- Saisi du budget initial issu du chiffrage commercial ventilé selon typologie d'achat (matériel, prestations, ETPs, etc.) ;
- Communication avec l'ERP log/achat pour suivre les dépenses du projet par typologie d'achat ;
- Alerte en cas de dépassement budgétaire ;
- Jauges budgétaire dynamique (ex : % du budget dépensé)

Pilotage financier macro :

- Visualisation des dépenses :

- Prévisionnelle : budget issu du chiffrage donc disponible avant commande et indication du prévisionnel de dépense pour alimenter le plan de trésorerie du pôle finance ;
- Engagées : commandes passées pas encore payées
- Réalisées : dépenses effectives, factures payées
- Saisi de jalons de facturation et lien entre jalons et étapes clés du projet ;
- Génération automatique des demandes de facturation une fois le jalon validé ;
- Retour de statut des factures : payé / en attente ;
- Alimentation du suivi budgétaire par le suivi des heures ;
- Calcul automatique de l'objectif de marge et de l'atterrissage.

e. Composante RH

La gestion de projet coordonne tant les ressources matérielles qu'humaines. Nous avons donc besoin que l'ERP GdP soit relié avec l'outil de gestion des absences du personnel :

- Prise en compte automatique des congés dans les plannings ;
- Blocage des périodes indisponibles ;
- Alertes au manager et au chargé de projet en cas de conflit entre congés et tâches projet existantes ;

3. Interconnexions

L'interconnexion au sein de l'outil est indispensable :

- Les plannings projet alimentent les plannings managers et collaborateurs ;
- Les plannings individuels (collaborateurs) remontent les informations vers les plannings projets (changement de statut de la tâche par exemple et conflit).

→ Système d'alertes en cas de modification impactante.

Tout comme une interconnexion avec les ERPs des autres pôles comme nous l'avons déjà précisé.

L'outil devra permettre également la possibilité d'interconnexions futures. Par exemple, lorsqu'un outil de suivi de parc machine/pilote sera créé, l'outil devra pouvoir prendre en compte la disponibilité de ces ressources et leur réservation.

Le schéma ci-dessous ainsi que la matrice ci-contre reprennent les interconnexions attendues.

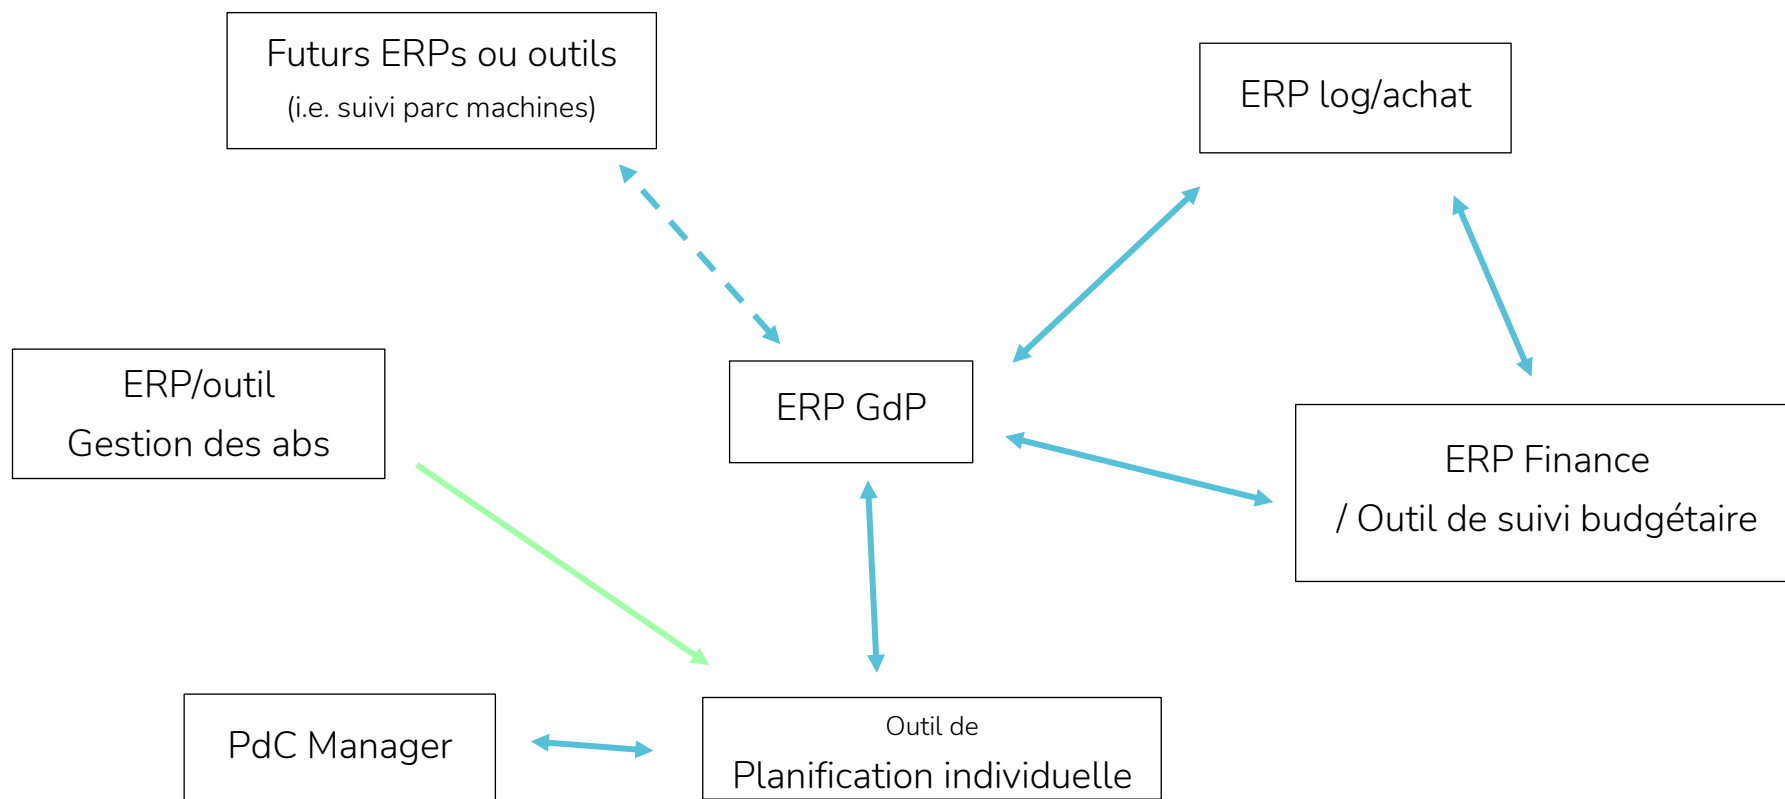


Figure 3 : Synoptique sommaire d'interconnexion

Légende :

Interconnexion 

Connexion simple 



INOVAYA SAS

Dont le siège social est situé 254 rue Vendôme 69003 Lyon
 Immatriculée au RCS de Lyon B 837 594 027
 Capital Social 75 841,00 euros
 665 rue Pasteur - 38760 Chasse-sur-Rhône
 info@inovaya.com | www.inovaya.com | +33 4 28 29 42 31



Sens de l'info 	ERP GdP	Outil de planification individuelle	PdC Manager	ERP Finance	ERP log/achat	Outil de gestion des absences
ERP GdP		1. Tâches projets (échéances / temps prévi) 2. Degré de prio des tâches projet 3. Planning projet	1. Charge globale projet/collaborateur 2. Détails tâches projets collaborateurs 3. Planning projet	1. Prévi des encaissements (jalon) 2. Dépenses prévi (catégorie et planning) 3. Demande de facturation 4. Suivi des heures/pers/projet	1. Lien/dépendance entre un achat et une tâche projet 2. Alerte en cas de dépassement budgétaire par rapport au prévi	
Outil de planification individuelle	1. Statut des tâches projets 2. Absences 3. Temps réalisé par tâche (suivi des heures) 4. Dispo/indispo collaborateur		1. Détails toutes tâches collaborateurs 2. Charge globale collaborateur 3. Dispo/indispo collaborateur 4. Alerte en cas d'heures sup			1. Dispo/indispo du collaborateur pour poser congés
PdC Manager		1. Affectation projets 2. Affectation sujets hors projet 3. Degré de prio des tâches hors projets				
ERP Finance	1. Statut des encaissements client/subvention 2. Engagés et dépensés 3. Statut des paiements				1. Validation des achats 2. Etat de la dette par fournisseur	
ERP log/achat	1. Statut des achats 2. Impact retard sur planning projet 3. Coûts réels des dépenses 4. Obj de marge et atterrissage			1. Demande validation achats		
Outil de gestion des absences		1. Absences collaborateurs	1. Absences collaborateurs			

Figure 4 : Matrice détaillée d'interconnexion

III. ETUDE DE MARCHÉ

Les critères d'évaluation pour le benchmark sont les suivants :

- Couverture fonctionnelle (détaillée dans le présent CdC) ;
- Ergonomie de l'outil et facilité d'adoption ;
- Autonomie de paramétrage ;
- Délais de déploiement ;
- Formation des utilisateurs ;
- Souveraineté ;
- Support et maintenance ;
- Cloisonnement des accès : Collaborateur/GdP/Responsable
- Coût global (licence et services).

Un modèle de formulaire d'évaluation est disponible en annexe 1.



INOVAYA SAS

Dont le siège social est situé 254 rue Vendôme 69003 Lyon
Immatriculée au RCS de Lyon B 837 594 027
Capital Social 75 841,00 euros
665 rue Pasteur - 38760 Chasse-sur-Rhône
info@inovaya.com | www.inovaya.com | +33 4 28 29 42 31



DÉTAILS DU DOCUMENT

[Cette page est destinée à un **usage interne**. Si ce rapport est destiné à un **usage externe**, veuillez la supprimer avant l'exportation en PDF et l'envoi du document. Toutefois, cette page doit **être conservée** dans le document stocké dans nos dossiers internes.]

Référence du document :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Type projet			Numéro projet / Processus			Type document		Chrono document		

Nombre de pages : 12

Nombre d'annexes : 1

Emetteur du document [si différent d'InovaYa] :

Suivi des indices :

A				Première émission	23/04/26
REV.	RÉDACTEUR	VÉRIFICATEUR	APPROBATEUR	DESCRIPTION	DATE

Liste des révisions :

Révision A Première émission du document
